



**CONSORCIO HIDRAULICO  
DEL VALLE BONAERENSE DEL RIO COLORADO**

## **Informe Canal Sec. Km 43,000**

### ***“Trabajos de Mantenimiento previo a temporada de riego”***

Durante los meses de receso de riego, desde Mayo a Agosto del 2017, se realizaron los siguientes trabajos sobre el canal:

#### **1. Trabajos realizados.**

- Colocación de tres puentes entre RN3 y las vías, evitando así rodear por acceso a Igarzabal.
- Limpieza de lama en seco desde puente de Pino hasta las vías.
- Sacar embanque desde Toma a puente de Pino.
- Retiro de arena de embanque a bajos de Pino y préstamo del Principal Villalonga.
- Picado de cuevas en la cola del Canal, sector de Flores, Presa y Garzoni.
- Arreglo de Retención 12 de Presa.
- Relleno de Fondo desde RN3 hasta Retención 1.

#### **2. Propuesta para mejorar el manejo del Canal.**

- Tres aforos semanales, mayor transparencia en la partición del recurso.
- Colocación de puentes para mejorar la transitabilidad de maquinaria, menos tiempos de demora.
- Informes periódicos sobre distribución de agua, trabajos de máquina y asuntos varios.
- Seguimientos de maquina cerciorando lo trabajado con lo facturado por los maquinistas.
- Cumplir con turnados.
- Mejoras tanto en estructura como en obras de arte en el Canal.



**CONSORCIO HIDRAULICO  
DEL VALLE BONAERENSE DEL RIO COLORADO**

- Control sobre el canal por colocación de tablas y mal uso del agua.

**3. Resultados del Relleno de Fondo.**


✓ **Presupuesto**

Descripción del trabajo	Rendimiento	horas	Precio/hora	Precio Total
Rastra hacer limpieza	3000 mts lineales/Hora	1	\$ 1.398,00	\$ 1.398,00
Excavadora relleno fondo	50 mts3/Hora	30	\$ 1.669,00	\$ 49.557,95
Patatas de cabra para compactar	3000 mts lineales/Hora	4	\$ 1.398,00	\$ 5.592,00
Excavadora habilitar canal (rampas para pata de cabra)		4	\$ 1.839,00	\$ 7.356,00
				\$ 63.903,95

✓ **Gastado**

Descripción del trabajo	Rendimiento	horas	Precio/hora	Precio Total
Rastra hacer limpieza	3000 mts lineales/Hora	1	\$ 1.398,00	\$ 1.398,00
Excavadora relleno fondo	50 mts3/Hora	27	\$ 1.669,00	\$ 45.063,00
				\$ 46.461,00

**4. Datos estadísticos de relevancia.**

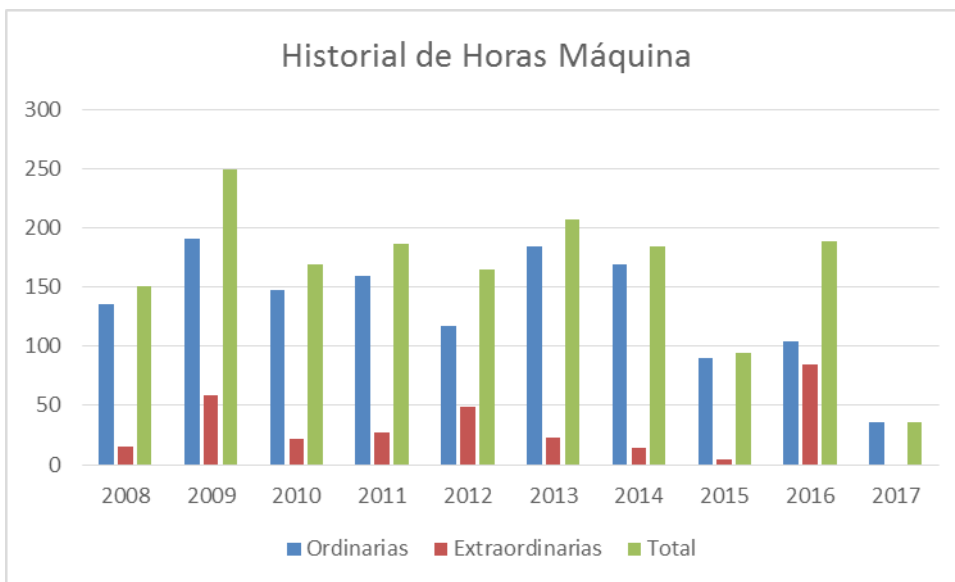



## CONSORCIO HIDRAULICO DEL VALLE BONAERENSE DEL RIO COLORADO

